JADWAL NASIONAL KEGIATAN KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) PASCA REVISI DIPA
TAHUN ANGGARAN 2022

No	KEGIATAN	HARI	MULAI	SELESAI
A	TINGKAT PUSAT			
A.1	KEPMEN PENETAPAN LOKASI DAN BESARAN ANGGARAN IBM DJCK TA.2022			
	Keputusan Menteri PU-PR Penetapan Lokasi dan Besaran Anggaran Kegiatan IBM DJCK TA. 2022	1	07/04/2022	07/04/2022
	SE PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN IBM CK TA.2022			
	SE Dirjen Cipta Karya Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan IBM di Lingkungan DJCK	1	11/03/2022	11/03/2022
A.2	DIPA SATKER IBM TA.2022			
	Proses Revisi DIPA Satker Pelaksanaan PPW	68	04/04/2022	10/06/2022
A.3	PERSIAPAN			
	Pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian Pusat	12	14/03/2022	25/03/2022
	Penyusunan Petunjuk Teknis Kegiatan IBM KOTAKU	88	03/01/2022	31/03/2022
	Finalisasi Petunjuk Teknis Kegiatan IBM KOTAKU TA. 2022	19	21/03/2022	08/04/2022
	Pengadaan Konsultan Teknis Pengendalian (KTP) Kegiatan IBM Dit. PKP	62	09/03/2022	09/05/2022
	Mobilisasi Konsultan Teknis Pengendalian (KTP) Kegiatan IBM Dit. PKP	5	09/05/2022	13/05/2022
	Review Modul Pelatihan TA.Pr dan Buku Saku Fasilitator Pendamping	19	21/03/2022	08/04/2022
	Rapat Koordinasi Awal/Sosialisasi Kegiatan IBM Direktorat PKP	2	15/06/2022	16/06/2022
	Workshop Implementasi Petunjuk Teknis Kegiatan IBM Dit. PKP TA. 2022	4	16/06/2022	19/06/2022
A.4	PENGAWASAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN			
	Pengawasan dan Pengendalian berkala	362	03/01/2022	30/12/2022
	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Pekerjaan	16	01/12/2022	16/12/2022
B	TINGKAT PROVINSI			
B.1	PERSIAPAN			
	Seleksi dan Rekruitmen Tenaga Ahli Provinsi & Asst. TAPr Kegiatan KOTAKU	57	05/04/2022	31/05/2022
	Seleksi dan Rekruitmen Fasilitator Masyarakat (FM) Kegiatan KOTAKU	57	05/04/2022	31/05/2022
	Mobilisasi Tenaga Ahli Provinsi (TAPr) & Asst. TAPr Kegiatan KOTAKU	1	10/06/2022	10/06/2022
	Masa kontrak penugasan Tenaga Ahli Provinsi (TAPr) Kegiatan KOTAKU	204	10/06/2022	30/12/2022
	Masa kontrak penugasan Asisten Tenaga Ahli Provinsi (Asst. TAPr) Kegiatan KOTAKU	204	10/06/2022	30/12/2022
	Mobilisasi Fasilitator Masyarakat (FM) Kegiatan KOTAKU	1	10/06/2022	10/06/2022
	Masa kontrak penugasan FM Kegiatan KOTAKU	180	10/06/2022	06/12/2022
B.2	PELATIHAN dan PENDAMPINGAN			
	Pelatihan/Pembekalan Awal FM Kegiatan KOTAKU	24	22/06/2022	15/07/2022
	Pelatihan Berkala untuk FM (Perencanaan, Pelaksanaan dan Keuangan)	143	22/06/2022	11/11/2022
B.3	WORKSHOP dan RAPAT KOORDINASI			
	Rapat Koordinasi Awal Persiapan Pelaksanaan (satu kali pelaksanaan)	25	21/06/2022	15/07/2022
	Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan (dua kali Pelaksanaan)			
	Rapat Evaluasi akhir Kegiatan (satu kali pelaksanaan)	24	07/11/2022	30/11/2022
B.4	TINGKAT KABUPATEN			
	Sinkronisasi Program Daerah dengan KOTAKU	22	27/06/2022	18/07/2022
C	TINGKAT KELURAHAN/DESA DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN			
C.1	PERSIAPAN			
	Pemilihan/Pembentukan Penyelenggara Swakelola	55	07/04/2022	31/05/2022
	Pembuatan Surat Kesanggupan Memanfaatkan dan Memelihara Infrastruktur Terbangun	55	07/04/2022	31/05/2022
C.2	PERENCANAAN			
	Pertemuan Warga I	22	27/06/2022	18/07/2022
	Identifikasi dan Penilaian Lokasi Kumuh	26	27/06/2022	22/07/2022
	Sinkronisasi Hasil Identifikasi dan Penilaian Lokasi Kumuh	26	27/06/2022	22/07/2022
	Pertemuan Warga II	17	11/07/2022	27/07/2022
	Survei Rencana Infrastruktur	18	12/07/2022	29/07/2022
	Penyusunan Dokumen Perencanaan	25	12/07/2022	05/08/2022
	Evaluasi dan Pengesahan Dokumen Perencanaan (PPK PKP)	25	22/07/2022	15/08/2022
	Dukungan Bantuan Teknis Perencanaan DED dan RAB Tk Pusat	25	12/07/2022	05/08/2022
	Penyusunan Rancangan Perjanjian Kerja Sama (PKS)/Kontrak Swakelola	26	25/07/2022	19/08/2022
C.3	PELAKSANAAN			
	Penandatanganan PKS/Kontrak Swakelola antara PPK dengan Penyelenggara Swakelola	28	27/07/2022	23/08/2022
	Rapat Pra-Pelaksanaan	27	28/07/2022	23/08/2022
	Pelatihan Berkala untuk Peyelenggara Swakelola Pelaksanaan Konstruksi	85	08/08/2022	31/10/2022
	Pencairan KPPN Tahap Pertama (70%)	26	01/08/2022	26/08/2022
	Penyaluran Termin 40% ke Penyelenggara Swakelola	17	03/08/2022	19/08/2022
	Penyaluran Termin 30% ke Penyelenggara Swakelola	12	22/08/2022	02/09/2022
	Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur	115	27/07/2022	18/11/2022
	Pencairan KPPN Kedua (30%)	36	01/09/2022	06/10/2022
	Penyaluran Termin 30% ke Penyelenggara Swakelola	36	01/09/2022	06/10/2022
D	PASCA PELAKSANAAN			
	Pemeriksaan Hasil Akhir Pekerjaan (progres 100%) oleh Tim Penilai Provinsi	61	26/09/2022	25/11/2022
	Pertemuan Warga III (Laporan pertanggung jawaban Penyelenggara Swakelola)	64	28/09/2022	30/11/2022
	Serah Terima Pekerjaan Penyelenggara Swakelola ke PPK Provinsi	64	28/09/2022	30/11/2022
	Serah terima Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ke Pemerintah Kota atau Pemerintah Desa	64	30/09/2022	02/12/2022
	Evaluasi Pemanfaatan dan Pemeliharaan	78	30/09/2022	16/12/2022

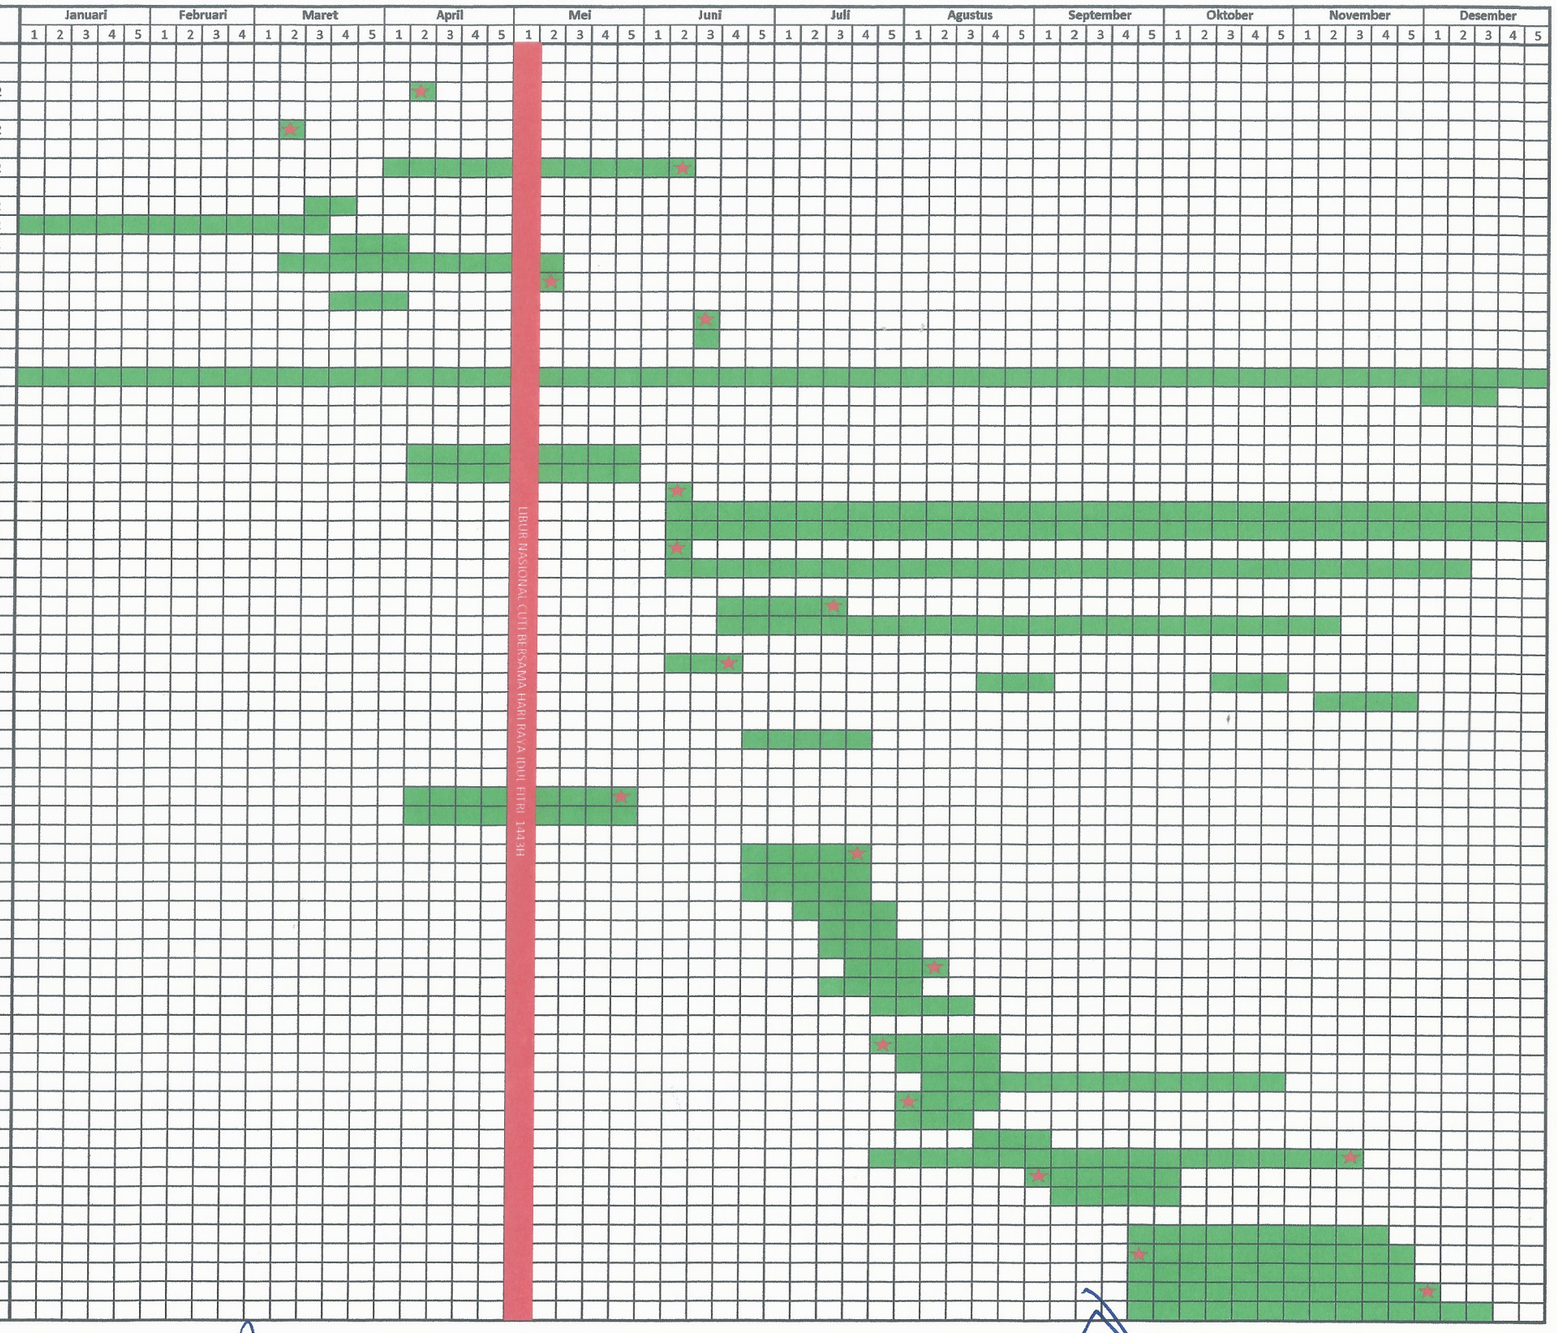

hari libur idul fitri

DIREKTUR
PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

IR. J. WAHYU KUSUMOSUSANTO, MUM.
NIP. 196611181995031001

KETUA TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PUSAT
KEGIATAN IBM

VALENTINA, ST., M.Si, M. PLAN.
NIP. 197801122006042004

PPK KEGIATAN
PEMBINAAN MANAJEMEN II

MOKHAMAD FAKHRUR RIFQIE, S.IP.
NIP. 198707292010121007
